



ESTADISTICA INSTITUCIONAL  
SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Preparado por el Departamento de  
Planificación & Desarrollo

Julio 2025

## Contenido

Resumen Ejecutivo: Informe de Estadísticas Institucionales - Segundo Trimestre 2025....	3
Introducción .....	4
Ejecución de la Meta Física .....	4
Distribución de Plantas .....	10
<i>Producción de Plantas</i> .....	12
Ejecución presupuestaria .....	13
Conclusión.....	13

## Resumen Ejecutivo: Informe de Estadísticas Institucionales - Segundo Trimestre 2025

Este informe presenta los resultados de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País (DIGECAC) para el segundo trimestre de 2025 (Abril-Junio).

### Logros Clave:

**Meta Física de Embellecimiento:** La DIGECAC programó embellecer 695,039 metros cuadrados de áreas verdes y logró ejecutar 693,189 metros cuadrados, alcanzando un notable 99.73% de la meta. Los meses de mayo y junio lograron el 100% de la meta física programada, mientras que abril alcanzó un 99.37%.

- **Desempeño por Oficinas Provinciales:** La eficacia general por oficinas provinciales en el trimestre fue de 0.99734.
- **Uso de Plantas en Operativos:** Se utilizaron un total de 31,808 plantas, distribuidas en 24,243 para operativos externos y 7,565 para operativos internos.
- **Producción de Plantas:** Se sembraron 53,432 plantas ornamentales para producción, de las cuales 7,107 no prosperaron.
- **Ejecución Presupuestaria:** La DIGECAC demostró un desempeño excelente en su ejecución presupuestaria.
- **Meta Financiera:** Con una programación de RD\$99,310,384, se ejecutaron RD\$99,352,450, lo que representa una efectividad del 100.04%.
- **Meta Física:** Para las 695,039 unidades programadas, se ejecutaron 693,189, logrando una efectividad del 99.73%.

La DIGECAC ha demostrado un rendimiento excepcional durante el segundo trimestre de 2025, superando las expectativas en la ejecución financiera y logrando un alto grado de cumplimiento en sus metas físicas de embellecimiento. Estos resultados reflejan una gestión eficiente y efectiva de los recursos asignados.

# Introducción

El presente informe estadístico institucional ofrece una visión detallada del desempeño y los logros de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País (DIGECAC) durante el segundo trimestre del año 2025, abarcando los meses de abril, mayo y junio. Elaborado por el Departamento de Planificación & Desarrollo de la DIGECAC, este documento refleja el compromiso de la institución con el embellecimiento y mantenimiento de las vías y áreas de circunvalación en la República Dominicana. Dada la relevancia estratégica de estas infraestructuras para la conectividad y la imagen del país, la evaluación rigurosa de las metas físicas y financieras se torna fundamental. Este análisis proporcionará una comprensión clara de la eficacia operativa y la gestión de recursos de la DIGECAC, destacando los avances obtenidos en este periodo específico, con un enfoque en las acciones implementadas en la Zona Metropolitana, la región Norte y las diversas oficinas provinciales.

## Ejecución de la Meta Física.


Para el periodo Abril – Junio del año 2025, la DIGECAC había programado una meta física de 695,039 metros cuadrados de embellecimiento de áreas verdes de carreteras y avenidas de circunvalación para ser embellecidas en la Zona Metropolitana, región Norte y las oficinas provinciales. Los resultados de la ejecución del mencionado periodo reflejan que la DIGECAC ha logrado embellecer 693,189 metros cuadrados, el cual representa el 99.73% de la meta, como se puede apreciar en la tabla que se muestra más abajo.

Tabla 1. Comparación de Metros cuadrados Programados Vs Metros Cuadrados Ejecutados

Ejecución Presupuestaria Meta física Segundo Trimestre 2025				
Concepto	Abril	Mayo	Junio	Total
Metros Cuadrados Programados	291,991	202,216	200,832	695,039
Metros Cuadrados Ejecutados	290,141	202,216	200,832	693,189
% de Logro	99.37%	100.00%	100.00%	99.73%

Fuente: departamento de Planificación & Desarrollo



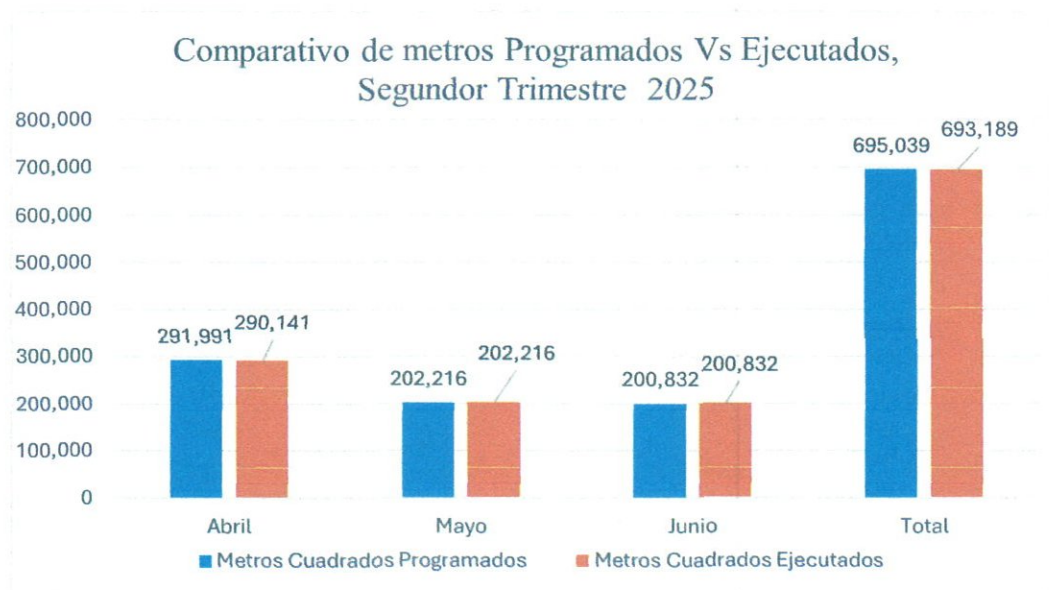


La tabla 2 muestra un resumen comparativo de la cantidad de metros cuadrados programados y la cantidad de metros cuadrados embellecidos por las diferentes oficinas provinciales, reflejando la efectividad de la ejecución por cada oficina durante el periodo abril-junio 2025.

Tabla 2. Metros Cuadrados Programados Vs Metros Cuadrados Embellecidos

Comparativo de Metros Cuadrados Programados Vs Trabajados II Trimestre 2025 por Oficina Provinciales				
Lugar	Intervenciones Carreteras /	M <sup>2</sup> Programados	M <sup>2</sup> Ejecutados	Sub-Indicador de Eficacia
Sede	30	83,405	83,562	1.001882051
Región Norte	21	55,603	53,016	0.953471556
Oficina Provincial Puerto Plata	29	55,603	55,355	0.995543658
Oficina Provincial Samana	28	55,603	56,839	1.022235436
Oficina Provincial San Francisco	27	55,603	55,535	0.998771627
Oficina Provincial La Vega	28	55,603	55,128	0.991447663
Oficina Provincial Santiago	32	55,603	55,131	0.991501915
Oficina Provincial Villa Tapia	27	55,603	54,957	0.988382449
Oficina Provincial Salcedo	20	34,752	35,489	1.021209647
Oficina Provincial San Pedro	23	41,702	42,499	1.019097886
Oficina Provincial La Romana	26	55,603	54,367	0.977776265
Oficina Provincial Hato Mayor	22	34,752	35,083	1.00951344
Oficina Provincial Barahona	28	55,603	56,229	1.011249491
Total de Trimestre	339	695,039	693,189	0.99734

Fuente. Informes de Ejecución II Trimestre 2025 División de Mantenimiento de Áreas, Zona Norte y Oficinas Provinciales.

Grafico 2. Muestra la comparación de la meta física de metros cuadrados y los metros cuadrados embellecidos por oficinas provinciales por el periodo abril-junio 2025.

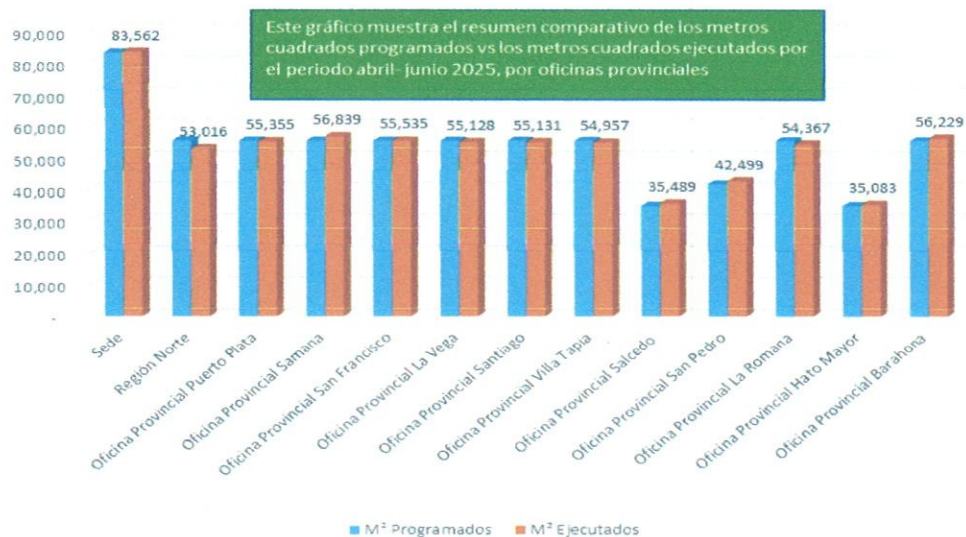

## Resultados por mes

A continuación, se muestran los logros alcanzados por meses durante el periodo Abril - Junio del 2025.

Los resultados serán mostrados mediante tablas y gráficos, en las tablas se podrán apreciar la comparación de los metros cuadrados programados vs los ejecutados por mes y oficinas provinciales y en cada encabezado se describe el contenido de las diferentes tablas y gráficos.

Tabla 3. Resumen comparativo del mes de abril 2025 de los metros cuadrados programados y los metros cuadrados embellecidos por oficinas provinciales.

Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. Departamento de Planificación y Desarrollo M2 Trabajados Abril II Trimestre 2025				
Lugar	Intervenciones Carreteras / Avenidas	M <sup>2</sup> Programados	M <sup>2</sup> Ejecutados	Sub-Indicador de Eficacia
Sede	7	34,101	34,814	1.02091625
Región Norte	4	23,445	23,156	0.98767712
Oficina Provincial Puerto Plata	10	23,445	23,253	0.99182122
Oficina Provincial Samaná	11	23,445	23,220	0.99043985
Oficina Provincial San Francisco	10	23,445	23,210	0.98997939
Oficina Provincial La Vega	10	23,445	23,210	0.98997939
Oficina Provincial Santiago	11	23,445	23,218	0.99034776
Oficina Provincial Villa Tapia	9	23,445	23,201	0.98961103
Oficina Provincial Salcedo	6	14,653	14,507	0.99001623
Oficina Provincial San Pedro	8	17,583	17,408	0.99004079
Oficina Provincial La Romana	9	23,445	23,229	0.99080821
Oficina Provincial Hato Mayor	7	14,653	14,506	0.98997203
Oficina Provincial Barahona	11	23,445	23,210	0.98997939
<b>Total Mes de abril</b>	<b>116</b>	<b>291,991</b>	<b>290,141</b>	<b>0.994</b>

Grafico 3. Muestra el comparativo del mes de abril 2025 de los metros cuadrados programados y los metros cuadrados embellecidos por oficinas provinciales.

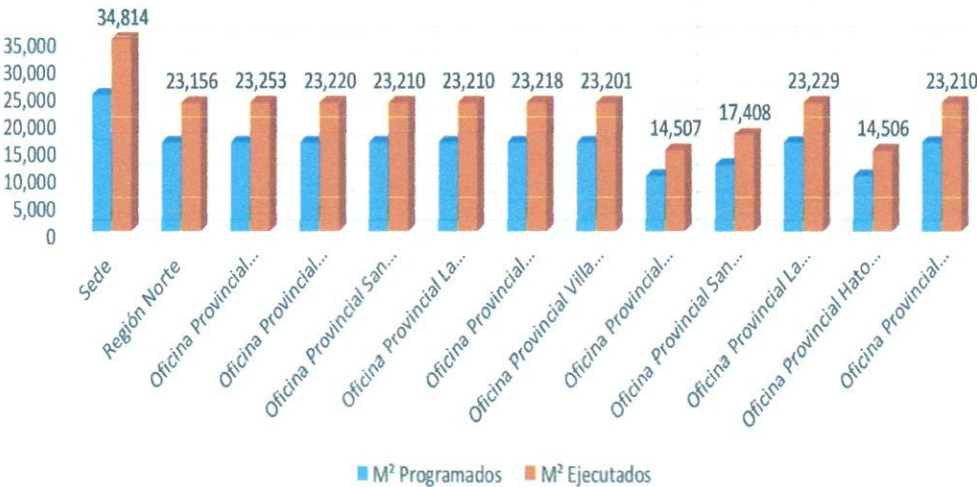




Tabla 4. Resumen comparativo del mes de mayo 2025 de los metros cuadrados programados y los metros cuadrados embellecidos por oficinas provinciales.

Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. Departamento de Planificación y Desarrollo M2 Trabajados Mayo II Trimestre 2025				
Lugar	Intervenciones Carreteras / Avenidas	M <sup>2</sup> Programados	M <sup>2</sup> Ejecutados	Sub- Indicador de Eficacia
Sede	12	24,266	24,264	0.99993881
Región Norte	8	16,177	14,309	0.88453631
Oficina Provincial Puerto Plata	9	16,177	16,320	1.00881366
Oficina Provincial Samaná	7	16,177	17,465	1.07957657
Oficina Provincial San Francisco	7	16,177	16,148	0.99819923
Oficina Provincial La Vega	8	16,177	16,198	1.0012951
Oficina Provincial Santiago	10	16,177	16,184	1.00041057
Oficina Provincial Villa Tapia	8	16,177	16,177	0.9999683
Oficina Provincial Salcedo	6	10,111	10,547	1.04311456
Oficina Provincial San Pedro	7	12,133	12,133	0.99999778
Oficina Provincial La Romana	9	16,177	15,182	0.93849302
Oficina Provincial Hato Mayor	7	10,111	10,125	1.00136445
Oficina Provincial Barahona	10	16,177	17,164	1.0610013
Total Mes de mayo	104	202,216	202,216	1



Gráfico 4. Muestra el comparativo del mes de mayo 2025 de los metros cuadrados programados y los metros cuadrados embellecidos por oficinas provinciales


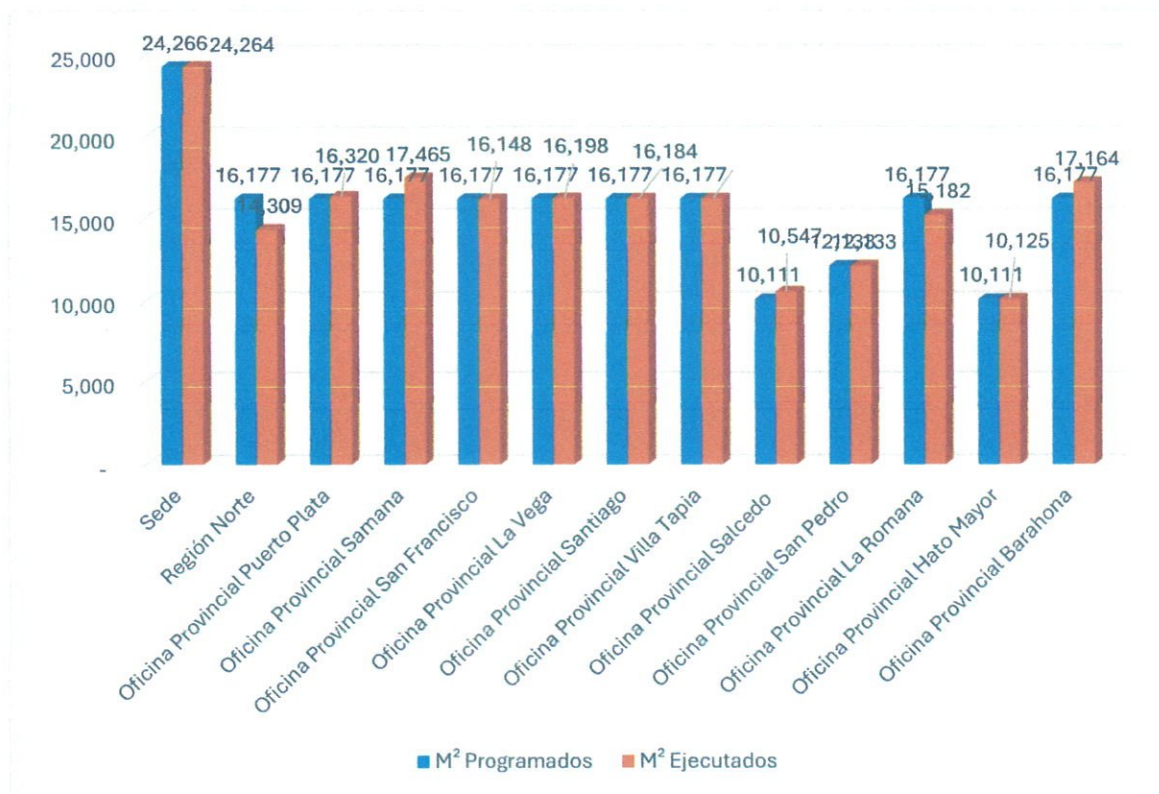


Tabla 5. Resumen comparativo del mes de junio 2025 de los metros cuadrados programados y los metros cuadrados embellecidos por oficinas provinciales.

Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. Departamento de Planificación y Desarrollo Mz Trabajados Junio II Trimestre 2025				
Lugar	Intervenciones	M² Programados	M² Realizados	Eficacia
Sede	11	24,721	24,377	0.98605362
Región Norte	9	16,010	15,754	0.98401689
Oficina Provincial Puerto Plata	10	16,010	15,864	0.99090671
Oficina Provincial Samaná	10	16,010	16,082	1.00448171
Oficina Provincial San Francisco	10	16,010	16,147	1.00857467
Oficina Provincial La Vega	10	16,010	15,814	0.98776877
Oficina Provincial Santiago	11	16,010	15,823	0.9883145
Oficina Provincial Villa Tapia	10	16,010	15,712	0.98135646
Oficina Provincial Salcedo	8	10,006	10,310	1.0303356
Oficina Provincial San Pedro	8	12,008	12,707	1.05825871
Oficina Provincial La Romana	9	16,010	16,029	1.00120734
Oficina Provincial Hato Mayor	8	10,006	10,338	1.03317339
Oficina Provincial Barahona	8	16,010	15,874	0.99152065
<b>Total Mes de junio</b>	<b>119.78</b>	<b>200,832</b>	<b>200,832</b>	<b>1</b>

Gráfico 5. Muestra el comparativo del mes de junio 2025 de los metros cuadrados programados y los metros cuadrados embellecidos por oficinas provinciales

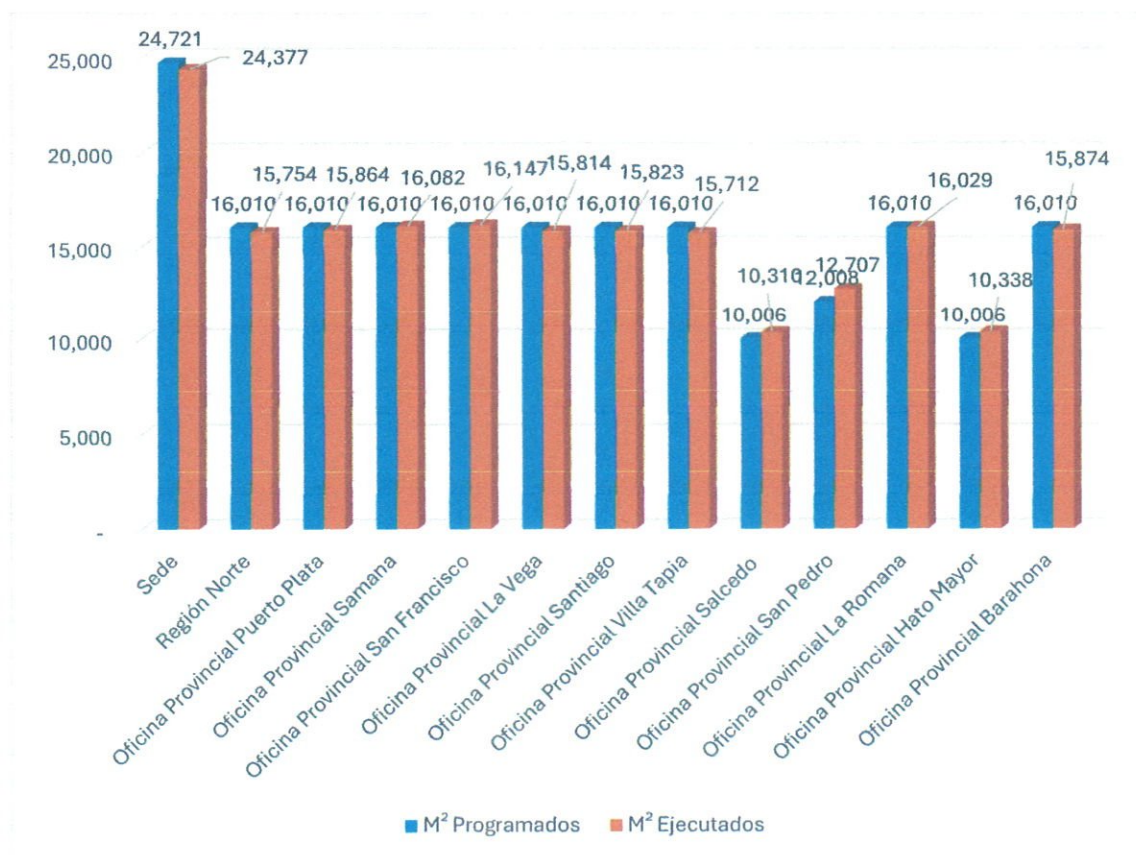

## Distribución de Plantas

A continuación, presentamos los resultados de las plantas utilizadas en operativos externos e internos, por el Departamento técnico (División de Producción y Distribución de Plantas), de esta Dirección General de Embellecimiento de las Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGECAC), Durante el Segundo Trimestre del año 2025.


Durante el periodo Abril -junio, La DIGECAC utilizó 24,243 plantas en operativos Externos y 7,565 en operativos Internos, para un total de 31,808 plantas, como se puede apreciar en la tabla siguiente.

Tabla No. VI

Plantas Utilizadas en Operativos en el Segundo Trimestre 2025

Concepto	Abril	Mayo	Junio	Total
Operativo Externo	5,404	11,553	7,286	24,243
Operativo Interno	2,096	3,496	1,973	7,565
Total general	7,500	15,049	9,259	31,808

Grafico VI

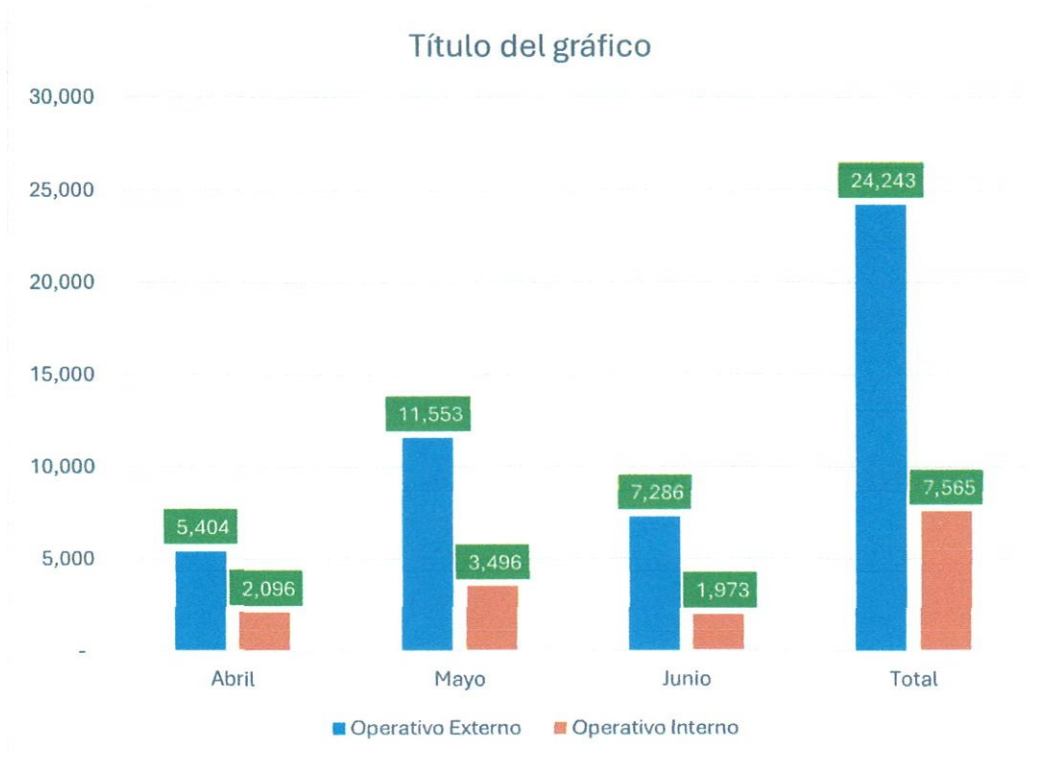




## Producción de Plantas

La DIGECAC durante el periodo Abril-junio 2025 sembró, para fine de producción, la cantidad de 53, 432 plantas ornamentales, de las cuales 7,107 plantas no prosperaron, como se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla no. VII

Concepto	Abril	Mayo	Junio	Total
Plantas Sembradas	20,520	13,590	19,322	53,432
Plantas No Prosperaron	1,717	4,755	635	7,107

Gráfico No. VII

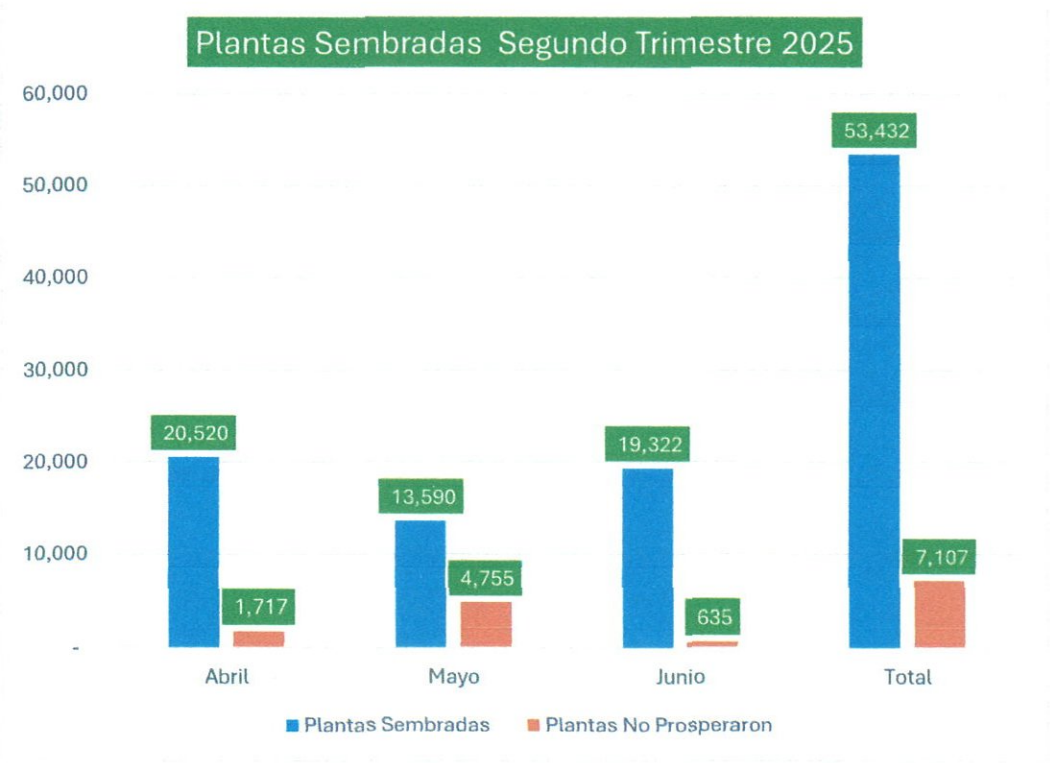

# Ejecución presupuestaria

La DIGECAC para el segundo trimestre obtuvo de desempeño excelente en su ejecución presupuestaria, tanto en meta financiera, como en la meta física, alcanzando un índice de efectividad de 100 % y 99,73% respectivamente, como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Tabla No. VIII

Ejecución Presupuestaria Meta Financiera y Física Segundo Trimestre 2025			
Concepto	Programada	Ejecutada	Efectividad
Meta Financiera- RD\$	99,310,384	99,352,450	100.04%
Meta Física- Unidades	695,039	693,189	99.73%

## Conclusión.

El informe del Segundo Trimestre de 2025 refleja un alto nivel de cumplimiento por parte de la DIGECAC en sus metas de embellecimiento y gestión de recursos. Los porcentajes de logro en la meta física y la efectividad en la ejecución presupuestaria demuestran una gestión eficiente durante este periodo.

  
Yolanda Peralta  
Analista Departamento de Planificación & Desarrollo
